



Gerenciamento de Projetos

Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

Gerenciamento do Escopo

Gerenciamento do Escopo do Projeto

- Garantir que o projeto **inclua todo o trabalho necessário, e somente o trabalho necessário**, para entregar o produto, serviço ou resultado com sucesso, conforme os requisitos definidos pelas partes interessadas.
- No contexto do projeto, o termo “escopo” pode se referir a:
 - Escopo do **produto**. As características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado.
 - Escopo do **projeto**. O trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. O termo “escopo do projeto” às vezes é visto como incluindo o escopo do produto.




Etapas:

- 1. Planejar o gerenciamento do escopo:** Criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os escopos do projeto e do produto serão definidos, validados e controlados.
- 2. Coletar os requisitos:** O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.
- 3. Definir o escopo:** O processo de desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto.



Etapas (continuação):

4. **Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP):** O processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
5. **Validar o escopo:** O processo de formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto.
6. **Controlar o escopo:** O processo de monitorar o status do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas na linha de base do escopo.



Visão geral

5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo

- .1 Entradas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de dados
 - .3 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento do escopo
 - .2 Plano de gerenciamento dos requisitos

5.2 Coletar os Requisitos

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Documentos de negócios
 - .5 Acordos
 - .6 Fatores ambientais da empresa
 - .7 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Tomada de decisões
 - .5 Representação de dados
 - .6 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .7 Diagramas de contexto
 - .8 Protótipos
- .3 Saídas
 - .1 Documentação dos requisitos
 - .2 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

5.3 Definir o Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de dados
 - .3 Tomada de decisões
 - .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .5 Análise de produto
- .3 Saídas
 - .1 Especificação do escopo do projeto
 - .2 Atualizações de documentos do projeto



Visão geral

5.4 Criar a EAP

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Decomposição
- .3 Saídas
 - .1 Linha de base do escopo
 - .2 Atualizações de documentos do projeto

5.5 Validar o Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Entregas verificadas
 - .4 Dados de desempenho do trabalho
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Inspeção
 - .2 Tomada de decisões
- .3 Saídas
 - .1 Entregas aceitas
 - .2 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

5.6 Controlar o Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Análise de dados
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto



Termo de Abertura do Projeto

- É o **documento** emitido pelo **responsável** pela iniciação do projeto ou **patrocinador** do projeto que **autoriza** formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.
- Ele documenta **informações de alto nível** sobre o projeto e sobre o produto, serviço ou resultado que o projeto deve satisfazer.



Termo de Abertura do Projeto: Informações

- **Finalidade** do projeto;
- **Objetivos** mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados;
- **Requisitos** de alto nível;
- Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave;
- **Risco** geral do projeto;
- Resumo do **cronograma** de marcos;
- **Recursos financeiros** pré-aprovados;
- Lista das **partes interessadas** chave;
- **Requisitos para aprovação** do projeto (ou seja, o que constitui o sucesso do projeto, quem decide se o projeto é bem sucedido e quem autoriza o encerramento do projeto);
- **Críticos de término** do projeto (ou seja, quais são as condições que devem ser cumpridas para encerrar ou cancelar o projeto ou fase);
- **Gerente** do projeto designado, responsabilidade e nível de autoridade ; e
- **Nome e autoridade do patrocinador** ou outra(s) pessoa(s) que autoriza(m) o termo de abertura do projeto.




EAP – Estrutura Analítica do Projeto


- Work Breakdown Structure - WBS
- O que é: É uma **decomposição hierárquica do escopo** do projeto em partes menores (pacotes de trabalho), mais gerenciáveis.
- Quem: Elaborada pelo **gerente** do projeto com a equipe, geralmente durante reuniões de planejamento.
- Quando: Durante a fase de **Planejamento**, após a definição e aprovação do escopo.



Amostra de EAP Organizada por Fase

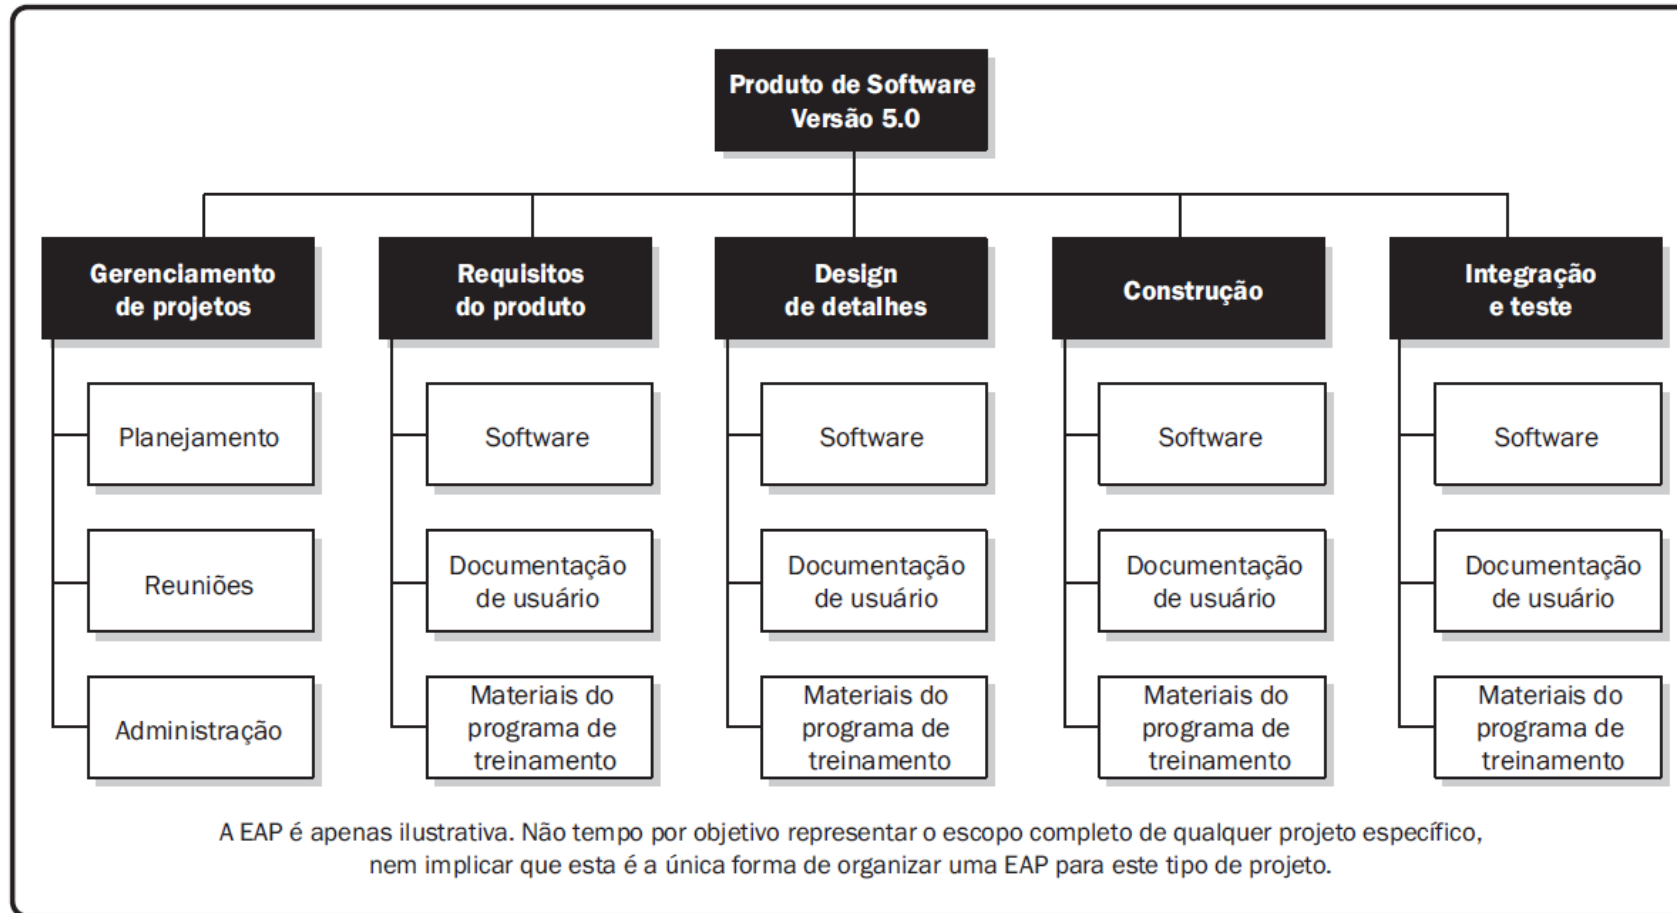

Exemplo de EAP com Entregas Principais

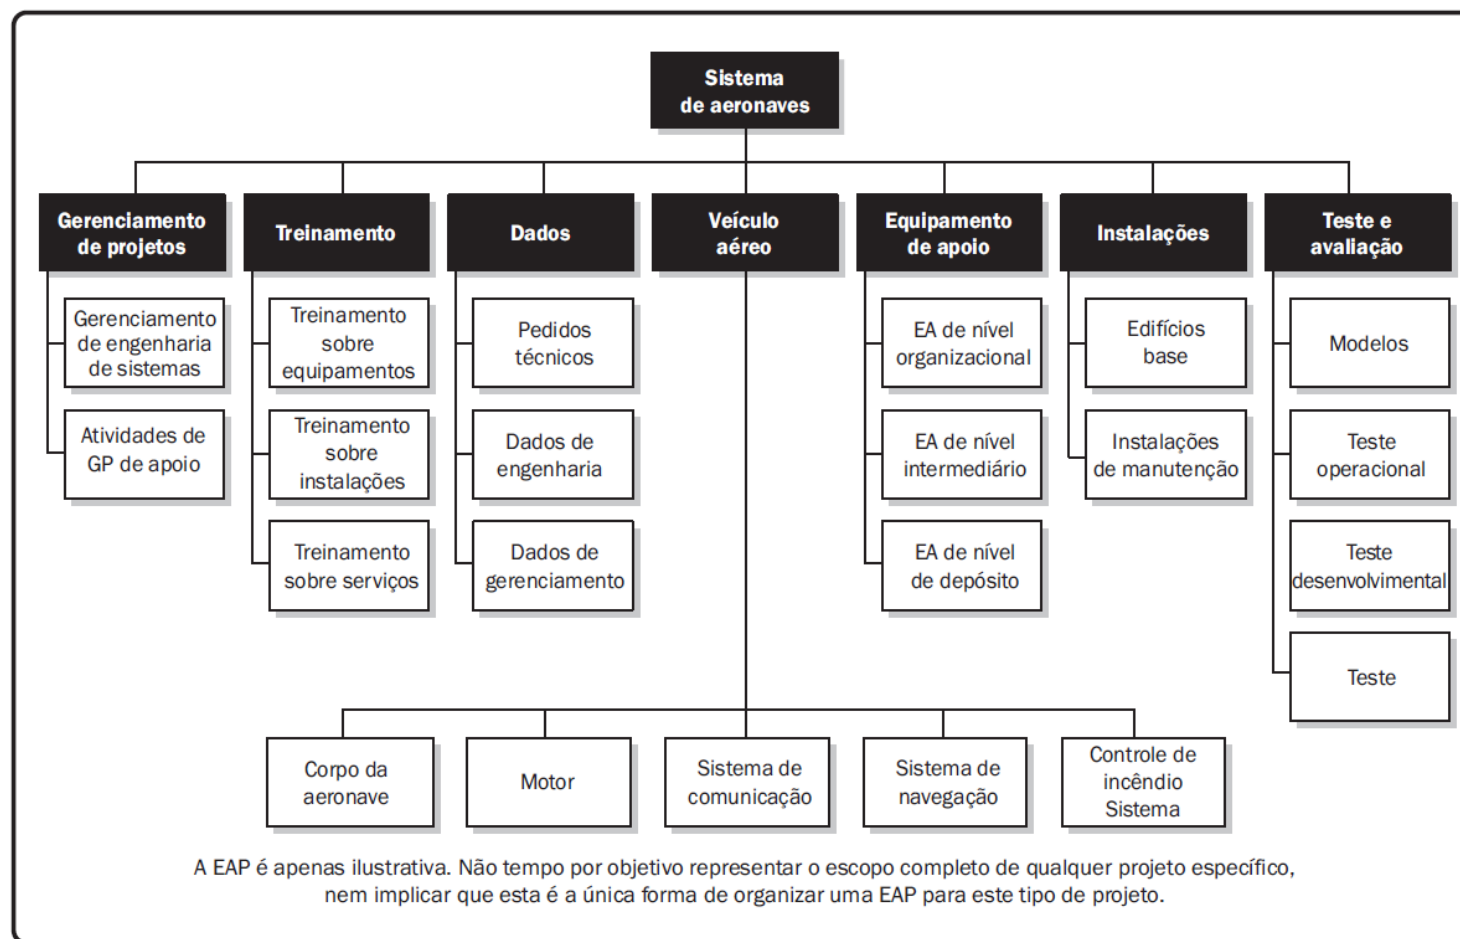

Referências

- PMI. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6ª ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2017.
- VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos**. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 04 ago. 2025.



Atividade: Elaboração da TAP e a EAP

- Formação de Grupos:
 - Trabalhem em grupos de até 4 alunos.
- Escolha do Projeto:
 - Se o grupo já possui um projeto final definido para o curso (ex: desenvolvimento de um sistema ou aplicativo), utilize-o.
 - Caso não tenham um projeto, utilize como base os seguintes temas:
 - Sistema de agendamento online para uma clínica
 - Aplicativo de controle de finanças pessoais
 - Plataforma de pedidos para uma pizzeria delivery
 - Sistema de biblioteca escolar

